ใบตรวจเช็ครถ AION ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

รุ่นรถ	YPlus490	หมายเลขตัวถัง		หมายเลขมอเตอร์		วันที่ผลิตรถ	
ชื่อตัวแทนจำหน่าย		สีรถ	white	วันที่ส่งส่งมอบรถ		วันที่ตรวจสอบรถ	

ผลการตรวจสอบ จะต้องระบุตามนี้ : ปกติ√ ผิดปกติ × แก้ไขแล้ว ○

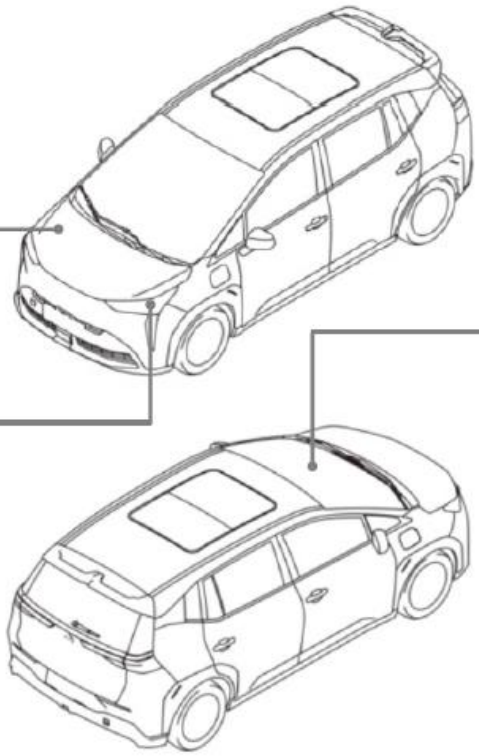

ลักษณะการทำสี

ประตู	✓
ฝากระโปร่งหน้าฝากระโปร่งหลัง	✓
กันชนหน้าและกันชนหลัง	✓
สเกิร์ตข้าง	✓
บังโคลน, ล้อแม็ก	✓
รูปลักษณภายใน	✓

กระจกหน้ารถและที่ปัดน้ำฝน

กระจกทำงานปกติ/การทำงานของระบบกันหนีบ	✓
การทำงานของที่ปัดน้ำฝน	✓
การทำงานของที่ฉีดกระจก	✓
การทำงานของ Sun roof*	✓

ระบบปรับอากาศ

ทดสอบการทำความเย็นและความร้อน	✓
ทิศทางลมตามหน้าจอรถ	✓

ระบบแสงสว่าง

ระบบไฟเดไทม์ (DRL)	✓
ไฟหน้าต่ำ	✓
ไฟหน้าสูง	✓
ไฟฉุกเฉิน	✓
ไฟตัดหมอกหน้า-หลัง	✓
ไฟเบรค	✓
ไฟถอย	✓
ไฟเลี้ยว	✓
ไฟในห้องเก๋ง	✓

ระบบความบันเทิง

ระบบนำทาง ทำงานปกติ	✓
การทำงานของระบบเครื่องเสียง	✓
การทำงานของระบบอุฐูท	✓
การทำงานของเครื่อข่ายมือถือ	✓
การทำงานระบบสั่งงานด้วยเสียง	✓
การทำงานระบบชาร์จมือถือไร้สาย*	✓
การทำงานของระบบกล้องรอบคัน	✓

การตรวจสอบระดับของเหลว

น้ำยาหล่อเย็น	✓
น้ำมันเบรค	✓
น้ำยาฉีดกระจก	✓

ระบบแชสซี

ระดับไฟแบตเตอรี่ มากกว่า 50%	✓
จุดเชื่อมต่อของท่อต่างๆ	✓
การขันแน่นของน็อตตรงจุดสำคัญ เช่น ขั้วแบตเตอรี่ 12V	✓

ระบบเบรกและพวงมาลัย

การทำงานของระบบเบรก	✓
การทำงานของปั๊มเบรกสูญญากาศ	✓
การทำงานของพวงมาลัย - ไม่กินซ้าย	✓

การปลั๊คล็อคของช่องชาร์จไฟ

ปุ่มปลดล็อคบนรีโมท	✓
สวิตช์ชาร์จไฟ	✓
เคเบิ้ลปลอดล็อคด้วยมือ	✓

การตรวจสอบแบตเตอรี่ (12V, 45Ah) ขณะดับรถ

1) ค่าความต่างศักย์ _____V (≥12.6V)
2) สุขภาพแบตเตอรี่ (SOH) _____% (≥80%)
3) สถานะการชาร์จ (SOC) _____% (100%)
4) CCA_____A (≥400A)

การตรวจสอบ ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของรถ

จะต้อง<u>ไม่พบ</u>ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของรถบนหน้าจอสว่างโดยเด็ดขาด ✓

การวิเคราะห์และอัพเดทซอฟท์แวร์หน้าจอรถ

การลบรหัสปัญหาโดยใช้ VDCI ☑

ตรวจสอบและอัพเดทซอฟท์แวร์หน้าจอรถ ☑

Nonconforming item and treatment result

No.	รายการที่ตรวจสอบ	ปัญหาที่พบ	สาเหตุและการแก้ไข
1			
2			
3			

คำเตือน: เนื่องจากรถยนต์เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงสูง จึงต้องมีมาตรการป้องกันฉนวนก่อนดำเนินการตรวจสอบรถยนต์ อย่าเสียบหรือถอดชุดสายไฟแรงสูงใดๆ ในระหว่างการตรวจสอบ หากจำเป็นต้องบำรุงรักษา โปรดดูคู่มือการบำรุงรักษา

ล้างรถ+ดูรอยรอบคันโดย: _____ ตรวจสอบรอบคัน (PDI) โดย: _____ Sales Adviser: _____

ลงโปรแกรม+VDCI โดย: _____ วันที่: _____

วันที่: _____

1. เติมลมยาง 37 40-41

⚠ สาขา จะต้องดำเนินการ PDI ก่อนส่งมอบรถใหม่เพื่อให้แน่ใจว่ารถอยู่ในสภาพดี 100%
