ใบตรวจเช็ครถ AION ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

รุ่นรถ	YPlus 480	หมายเลขตัวถัง		หมายเลขมอเตอร์		**วันที่ผลิตรถ**	
ชื่อตัวแทนจำหน่าย		สีรถ	white	**วันที่ส่งส่งมอบรถ**		**วันที่ตรวจสอบรถ**	

ผลการตรวจสอบ จะต้องระบุตามนี้ **:** ปกติ√ ผิดปกติ × แก้ไขแล้ว ○

ลักษณะการทำสี

ประตู	√
ฝากระโปร่งหน้าฝากระโปร่งหลัง	√
กันชนหน้าและกันชนหลัง	√
สเกิร์ตข้าง	√
บังโคลน, ล้อแม็ก	√
รูปลักษณภายใน	√

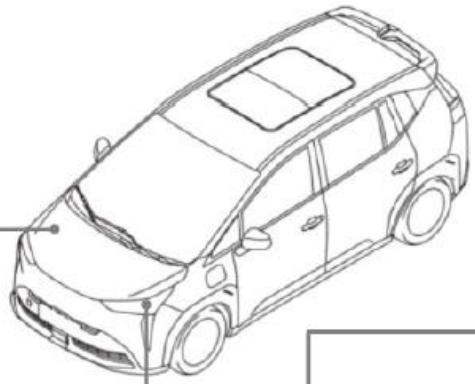

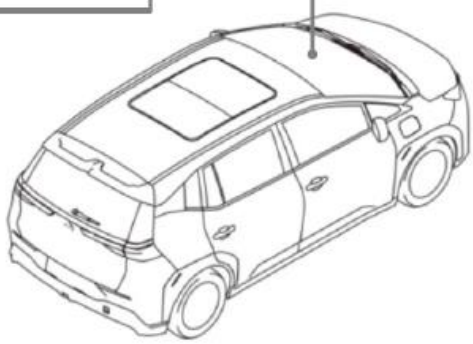

กระจกหน้ารถและที่ปัดน้ำฝน

กระจกทำงานปกติ/การทำงานของระบบกันหนีบ	√
การทำงานของที่ปัดน้ำฝน	√
การทำงานของที่ฉีดกระจก	√
การทำงานของ Sun roof*	√

ระบบปรับอากาศ

ทดสอบการทำความเย็นและความร้อน	√
ทิศทางลมตามหน้าจอรถ	√

ระบบแสงสว่าง

ระบบไฟเดไทม์ (DRL)	√
ไฟหน้าต่ำ	√
ไฟหน้าสูง	√
ไฟฉุกเฉิน	√
ไฟตัดหมอกหน้า-หลัง	√
ไฟเบรค	√
ไฟถอย	√
ไฟเลี้ยว	√
ไฟในห้องเก๋ง	√

ระบบความบันเทิง

ระบบนำทาง ทำงานปกติ	√
การทำงานของระบบเครื่องเสียง	√
การทำงานของระบบอุฐูท	√
การทำงานของเครื่อข่ายมือถือ	√
การทำงานระบบสั่งงานด้วยเสียง	√
การทำงานระบบชาร์จมือถือไร้สาย*	√
การทำงานของระบบกล้องรอบคัน	√

การตรวจสอบระดับของเหลว

น้ำยาหล่อเย็น	√
น้ำมันเบรค	√
น้ำยาฉีดกระจก	√

ระบบแชสซี

ระดับไฟแบตเตอรี่ มากกว่า 50%	√
จุดเชื่อมต่อของท่อต่างๆ	√
การขันแน่นของน็อตตรงจุดสำคัญ เช่น ขั้วแบตเตอรี่ 12V	√

ระบบเบรกและพวงมาลัย

การทำงานของระบบเบรก	√
การทำงานของปั๊มเบรก สูญญากาศ	√
การทำงานของพวงมาลัย - ไม่กินช้าย	√

การปลั๊ดล็อคของช่องชาร์จไฟ

ปุ่มปลดล็อคบนรีโมท	√
สวิตช์ชาร์จไฟ	√
เคเบิ้ลปลอดล็อคด้วยมือ	√

การตรวจสอบแบตเตอรี่ (12V, 45Ah) ขณะดับรถ

1) ค่าความต่างศักย์ _____V (≥12.6V)
2) สุขภาพแบตเตอรี่ (SOH) _____% (≥80%)
3) สถานะการชาร์จ (SOC) _____% (100%)
4) CCA_____A (≥400A)

การตรวจสอบ ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของรถ √

จะต้อง<u>ไม่พบ</u>ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของรถบนหน้าจอสว่างโดยเด็ดขาด

การวิเคราะห์และอัพเดทซอฟท์แวร์หน้าจอรถ

การลบรหัสปัญหาโดยใช้ VDCI ☑

ตรวจสอบและอัพเดทซอฟท์แวร์หน้าจอรถ ☑

Nonconforming item and treatment result

No.	รายการที่ตรวจสอบ	ปัญหาที่พบ	สาเหตุและการแก้ไข
1			
2			
3			

คำเตือน: เนื่องจากรถยนต์เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงสูง จึงต้องมีมาตรการป้องกันฉนวนก่อนดำเนินการตรวจสอบรถยนต์ อย่าเสียบหรือถอดชุดสายไฟแรงสูงใดๆ ในระหว่างการตรวจสอบ หากจำเป็นต้องบำรุงรักษา โปรดดูคู่มือการบำรุงรักษา

ล้างรถ+ดูรอยรอบคันโดย: อิทธิพล **ตรวจสอบรอบคัน (PDI) โดย:** อิทธิพล Sales Adviser: _____

ลงโปรแกรม+VDCI โดย: อิทธิพล **วันที่:** _____

วันที่: _____

1. **เติมลมยาง** 37 40 – 41

⚠ สาขา จะต้องดำเนินการ PDI ก่อนส่งมอบรถใหม่เพื่อให้แน่ใจว่ารถอยู่ในสภาพดี 100%
